Project-plan-v1.0

RestSm&d



ΑΡΚΟΥΔΗΣ ΗΛΙΑΣ	AM:235481
ΜΠΑΣΤΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	AM:235593
ΟΡΕΣΤΗΣ ΦΑΚΩΤΑΚΗΣ	AM:235673
ΝΙΚΟΛΑΣ ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ	AM:235685
ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΑΠΑΡΟΒ	AM:235909

Ρόλοι μελών στο τεχνικό κείμενο

Editor: Μπαστούλης Γιώργος Contributor: Αρκούδης Ηλίας

Peer Reviewer: Χατζησταυρόπουλος Νίκολας, Φακωτάκης Ορέστης, Τσαπάροβ Γιάννης

Εργαλεία που χρησιμοποιήσαμε

Οι τεχνικές αναφορές γράφτηκαν σε Word και σε Libre Office. Τέλος για την δημιουργία του Logo του έργου χρησιμοποιήθηκε το LogoDesignStudioPro.

Project-plan-v0.1

Μόλις αποφοιτήσαμε και αποφασίσαμε οτι το έργο που προτείναμε θα το αναπτύξουμε πραγματικά και ξεκινάμε σήμερα 1/3/2019.Η ομάδα που θα κατασκευάσει το έργο απαρτίζεται απο 8 εργαζομένους.

Το έργο διαιρέθηκε σε τυπικά υποέργα (ΤΥ). Προσπαθήσαμε να κάνουμε λεπτομερή χρονοπρογραματισμό. Παρακάτω παρουσιάζεται ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα του έργου με τη μορφή Gantt Chart και κατόπιν Pert Chart.

Σχεδιασμός Υλοποίησης RestSm&d

ΤΥ1:Ανάλυση απαιτήσεων

ΤΥ2:σχεδιασμός ΒΔ

ΤΥ3: σχεδιασμός διεπαφής

ΤΥ4 :σχεδιασμός υποσυτήματος manager ΤΥ5 : σχεδιασμός υποσυτήματος πελατών ΤΥ6 : σχεδιασμός υποσυτήματος εργαζομένων

ΤΥ7 : ανάπτυξη ΒΔ

ΤΥ8 :υλοποιήση διεπαφής

ΤΥ9 : υλοποιήση υποσυστήματος manager
ΤΥ10 : υλοποιήση υποσυστήματος πελατών
ΤΥ11: υλοποιήση υποσυστήματος εργαζομένων

TY12:testing

ΤΥ13: κατάλληλες τροποποιήσεις ΤΥ14: εγκατάσταση αποδοχής


ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ (α)-(β)

Τυπικά Υποέργα	Προαπαιτούμενα Υποέργα	Αισιόδοξη εκτίμηση σε μέρες (OL)	Κανονική εκτίμηση σε μέρες (RL)	Απαισιόδοξη εκτίμηση σε μέρες (PL)
TY1		120	100	150
TY2	TY1	70	50	90
TY3	TY1	80	60	100
TY4	TY1	80	60	100
TY5	TY1	60	40	80
TY6	TY1	70	50	90
TY7	TY2	100	70	150
TY8	TY3	120	90	150
TY9	TY4	120	100	140
TY10	TY5	100	80	120
TY11	TY6	120	100	140


TY12	TY7-TY8-TY9- TY10-TY11	60	30	90
TY13	TY12	60	40	80
TY14	TY13	80	50	110

Σημειώνουμε ότι, στο αρχικό Gantt ακόμα δεν έχει γίνει η ανάθεση του έργου μας σε ανθρώπινο δυναμικό. Λαμβάνουμε υπόψη μας την κανονική εκτίμηση διάρκειας και παρουσιάζουμε το Gantt

Διάγραμμα Gantt Chart

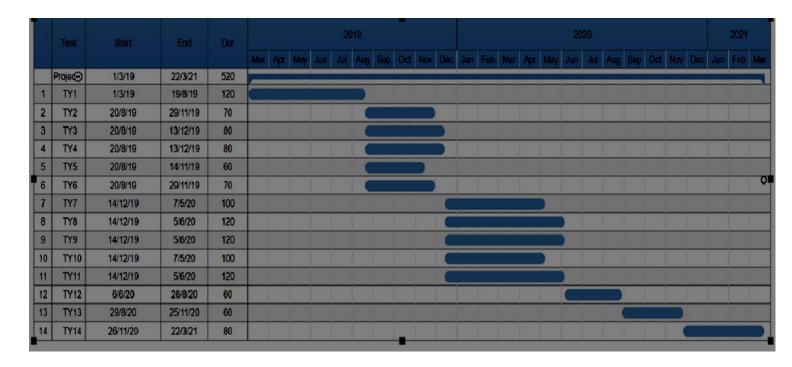

Διάγραμμα Αξιολόγησης Έργου - Pert Chart

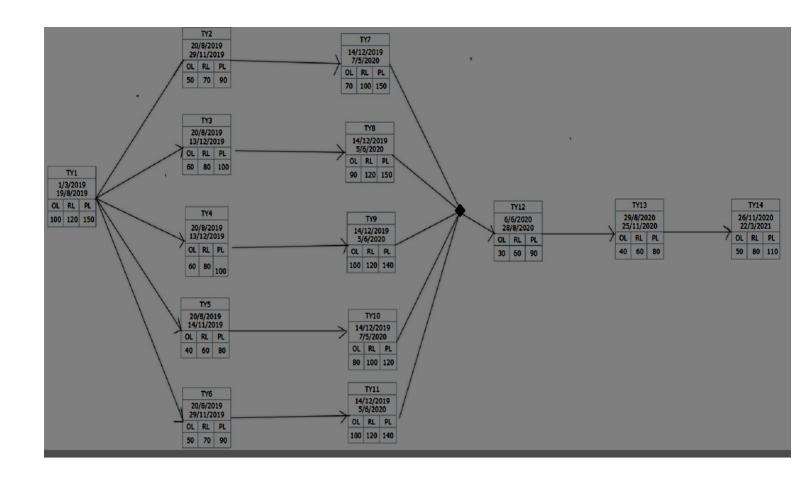

ΕΡΩΤΗΜΑ (γ)

Συγκεκριμένα υπάρχουν 3 έμπειροι εργαζόμενοι (Seniors)και 5 χωρίς ιδιαίτερη εμπειρία(Juniors). Το ποσοστό της προσπάθειας που θα καταβάλει ο κάθε εγαζόμενος φαίνεται παρακάτω:

Εργαζόμενος	Ποσοστό	Μισθός
Senior_1	100,00%	4000\$
Senior_2	50,00%	3000\$
Senior_3	50,00%	3000\$
Junior_1	100,00%	2000\$
Junior_2	100,00%	1500\$
Junior_3	100,00%	1000\$
Junior_4	50,00%	1000\$
Junior_5	50,00%	1000\$

1.Πίνακας κατανομής της δουλειάς σε ανθρωπο-ημέρες για τον κάθε εργαζόμενο

Παρουσιάζουμε νέο Gantt με την κατανομή ανθρώπινου δυναμικού όπως κρίναμε.

Task	Assigned To	Start	End	Dur	96	2019				2020			ī									
						Mer	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mer	Apr	May			Aug
Projec-		1/3/19	31/7/20	360		=								_		_					=	
TY1	Senior1-Junior3	1/3/19	23/5/19	60																		
TY2	Senior1-Junior1	24/5/19	15/7/19	35																		
TY3	Senior2-Junior4	24/5/19	17/9/19	80							=											
TY4	Senior3-Junior5	24/5/19	17/9/19	80																		
TY5	Junior2	24/5/19	19/8/19	60																		
TY6	Junior3	24/5/19	3/9/19	70																		
TY7	Senior1-Junior1	16/7/19	24/9/19	50																		
TY8	Junior4-Senior2	18/9/19	12/3/20	120																		
TY9	Senior3-Junior5	18/9/19	12/3/20	120																		
TY10	Junior2	20/8/19	14/1/20	100																		
TY11	Junior3	4/9/19	27/2/20	120																		
TY12	Senior1-Junior1-Junior2	13/3/20	9/4/20	20																		
TY13	Senior2-Senior3-Junior4	10/4/20	5/6/20	40																		
TY14	Senior1-Junior4-Junior5	6/6/20	31/7/20	40																		

Παρακάτω φαίνονται τα κόστη που προκύπτουν για κάθε υποέργο ΤΥ:

TY1: Senior_1+Junior_3	\rightarrow (4000x2)+(1000x2)=10.000\$
TY2: Senior_1+Junior_1	→ (4000x1,166)+(2000x1,66)=6.960\$
TY3: Senior_2+Junior_4	→ (3000x2,66)+(1000x2,66)=10.660\$
TY4: Senior_3+Junior_5	→ (3000x2,66)+(1000x2,66)=10.660\$
TY5: Junior_2	→ 1500x2=3.000\$
TY6: Junior_3	→ 1000x2.33=2.330\$
TY7: Senior_1+Junior_1	→ (4000x1,66)+(2000x1,66)=9.960\$
TY8: Senior_2+Junior_4	→ (3000x4)+(1000x4)=16.000\$
TY9: Senior_3+Junior_5	→ (3000x4)+(1000x4)=16.000\$
TY10: Junior_2	→ 1500x3,33=5.000\$
TY11: Junior_3	→ 1000x4=4.000\$
TY12: Senior_1+Junior_1+Junior_2	\rightarrow (4000x0,66)+(2000x0,66)+(1500x0,66)=4.976\$
TY13: Senior_2+Senior_3+Junior_4	\rightarrow (3000x1,33)+(3000x1,33)+(1000x1,33)=9.313\$
TY14: Senior_1+Junior_4+Junior_5	\rightarrow (4000x1,33)+(1000x1,33)+(1000x1,33)=7.980\$

Η εκτίμηση του συνολικού κόστους για όλο το έργο είναι : 116,839\$
